



**Сводный отчет
о ходе реализации портфеля проектов
Воронежской области в 2022 году**



Реализация региональных проектов



Реализация результатов

■ Достигнуты 100% ■ Достигнуты с отклонениями 95%-99% ■ Не достигнуты < 95%




Региональный проект	Количество результатов	Количество недостигнутых результатов	Выполнение, %	Причина
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	5	1	80	В связи с неготовностью пристройки для Борисоглебской районной больницы для размещения ангиографического оборудования и его несвоевременным вводом в эксплуатацию



Достижение показателей

■ Достигнуты 100% ■ Достигнуты с отклонениями 95%-99% ■ Не достигнуты < 95%

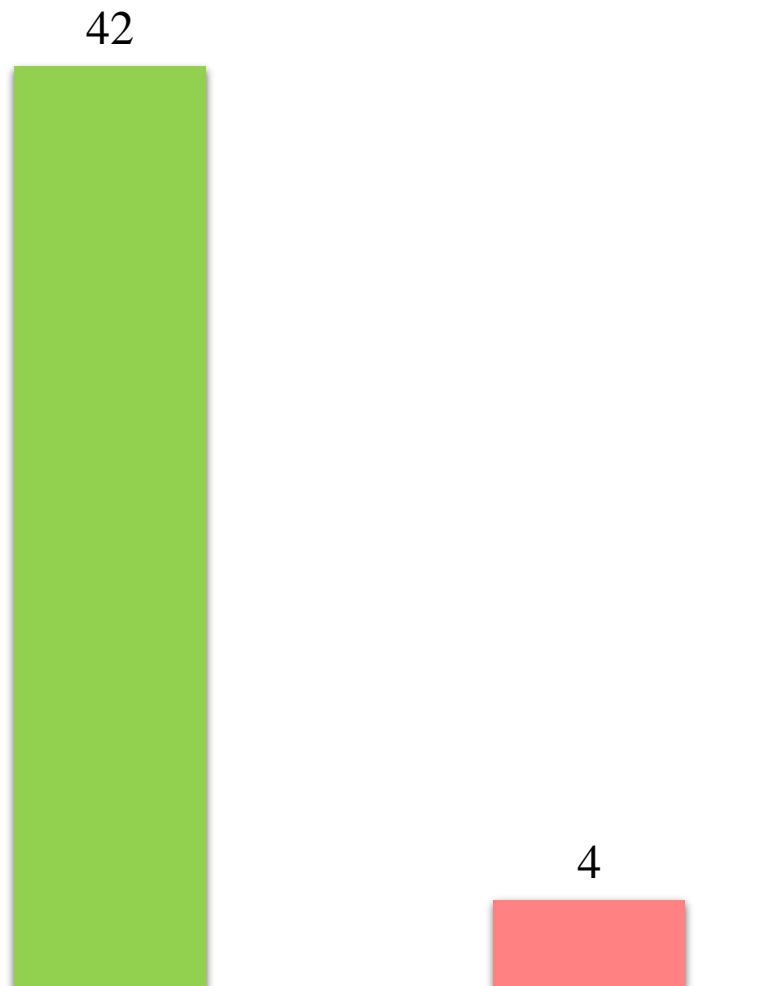


Региональный проект	Количество показателей	Количество недостигнутых показателей	Выполнение, %	Причина
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	9	2	77,8	В связи с изменением методики расчета врачебного персонала клиничко-диагностических лабораторий, эпидемиологических служб, клиничко-экспертных отделов, организационных и статистических отделов
Формирование комфортной городской среды	10	4	60	Информация предварительная; итоговое достижение показателей за 2022 год будет рассчитано в апреле 2023 года
Спорт - норма жизни	2	1	50	Списание спортивных сооружений, не подлежащих восстановлению, перенос сроков строительства объектов «Ледовая арена в г. Борисоглебск» и «Футбольный манеж в г. Воронеж» на 2023 и 2024 гг. соответственно
Развитие экспорта медицинских услуг	2	1	50	В связи со сложной внешнеполитической обстановкой



Кассовое исполнение

■ Достигнуты 99%-100%
 ■ Достигнуты с отклонениями 95%-99%
 ■ Не достигнуты < 95%

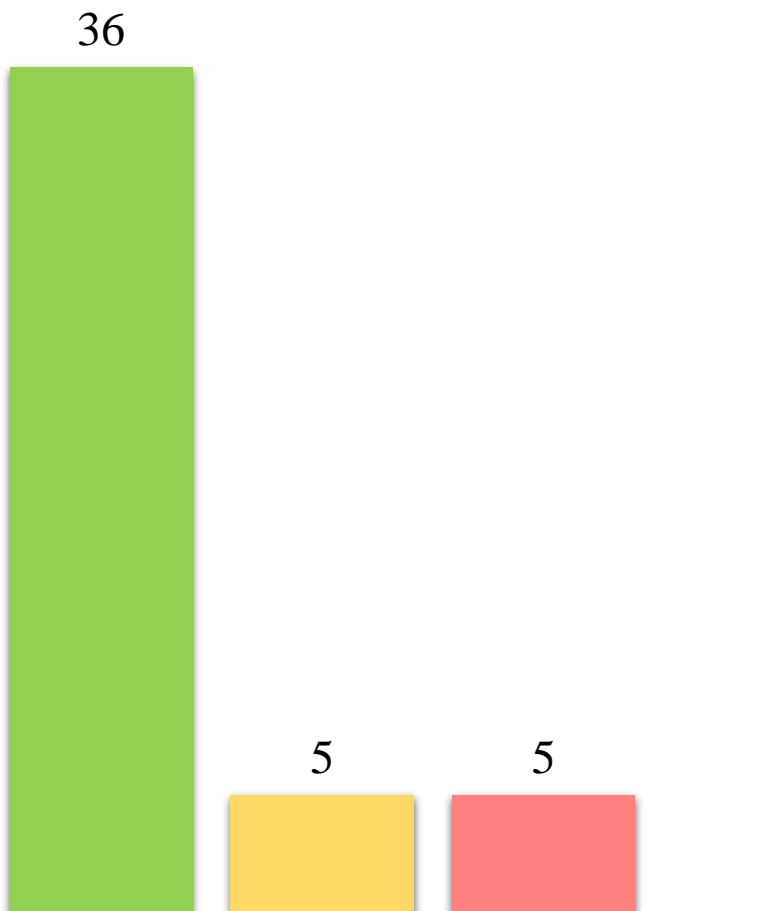


Региональный проект	Освоение, %	Причина
Содействие занятости	93,0	Экономия по итогам закупочных процедур
Борьба с онкологическими заболеваниями	93,0	Перераспределение областных средств на 2023 год
Жилье	93,8	Невыполнение планового объема работ и несвоевременная подготовка актов выполненных работ при строительстве поликлиники на Московском пр., школы и КНС в г. Борисоглебске
Современная школа	94,1	Несвоевременная подготовка актов выполненных работ при строительстве и экономия по закупочным процедурам
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	95,0	Срыв срока строительства многоквартирного дома в г. Семилуки
Культурная среда	96,2	Несвоевременная подготовка актов выполненных работ при строительстве и экономия по закупочным процедурам
Творческие люди	97,0	Экономия в рамках проведения мероприятия
Модернизация первичного звена здравоохранения	97,5	Несвоевременная подготовка актов выполненных работ при строительстве и экономия по закупочным процедурам
Спорт – норма жизни	98,4	Экономия по итогам закупочных процедур, перераспределение областных средств на 2023 год
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	98,7	Неготовность пристройки для Борисоглебской районной больницы для размещения ангиографического оборудования и его несвоевременный ввод в эксплуатацию



Объекты капитального строительства

■ Сданы ■ Не сданы ■ Переходящие

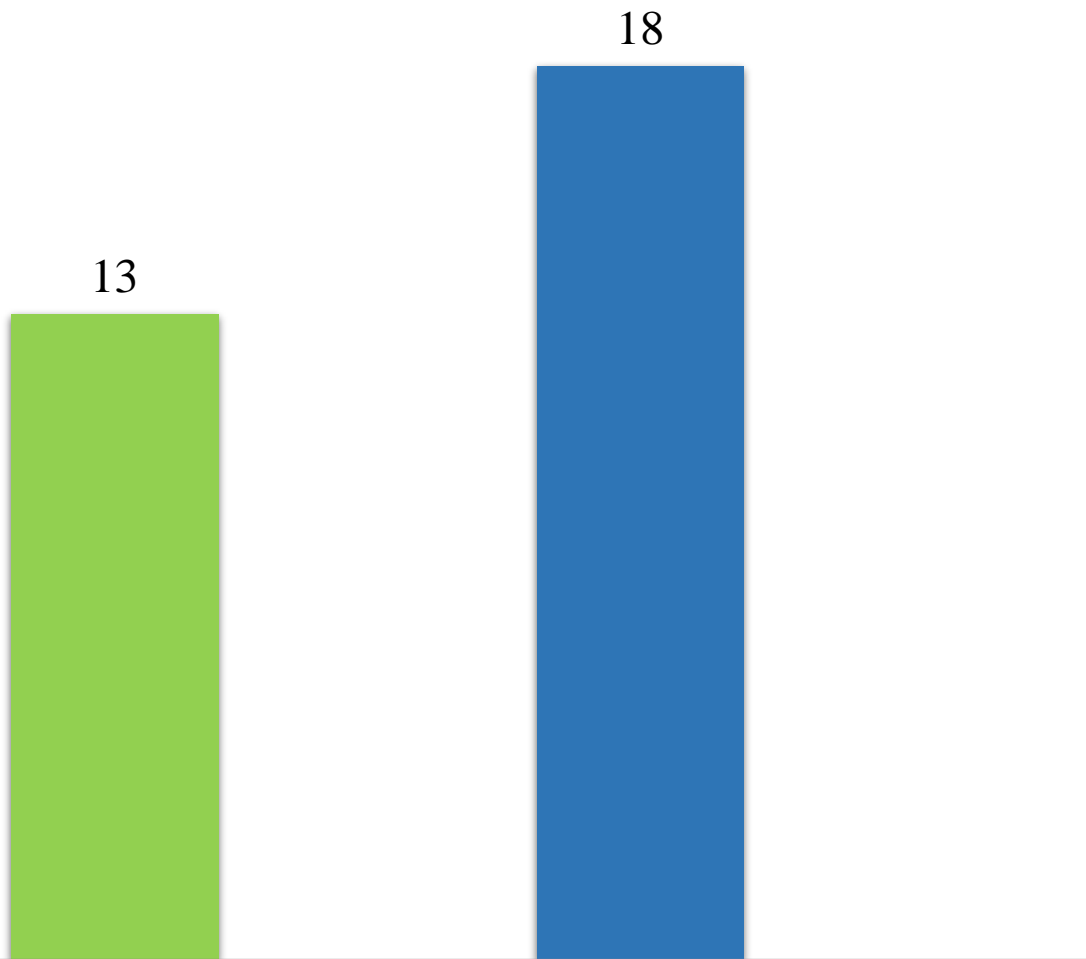

Объекты капитального строительства с вводом в эксплуатацию в 2022 году

Региональный проект	Количество объектов капитального строительства
Модернизация первичного звена здравоохранения	2
Жилье	4
Культурная среда	2
Современная школа	1
Чистая вода	4



Реализация стратегических проектов



Реализация результатов

■ Достигнуты 99%-100% ■ Достигнуты с отклонениями 95%-99% ■ Не достигнуты < 95%





Стратегический проект	Количество результатов	Количество недостигнутых результатов	Выполнение, %	Причина
Реконструкция Петровской набережной	5	2	60	Продление сроков реализации контракта по разработке проектно-сметной документации для освоения территории Петровской набережной (Благоустройство территории, II очередь) Невозможность объединения земельных участков различных форм собственности до завершения благоустройства территории I очереди



Достижение показателей

■ Достигнуты
100%

■ Не достигнуты
< 95%




Стратегический проект	Количество недостигнутых показателей	Выполнение, %	Причина
Реконструкция Петровской набережной	1	0	Недостижение показателя «Количество посещений территории Петровской набережной» обусловлено погрешностями планирования и продлением сроков работ подрядной организацией



Кассовое исполнение

■ Достигнуты 99%-100% ■ Достигнуты с отклонениями 95%-99% ■ Не достигнуты < 95%



Стратегический проект	Освоение, %	Причина
Историко-природный парк Костёнки-Борщёво-Архангельское	96,99	Экономия по результатам конкурсных процедур по определению исполнителя работ по устройству тротуара по ул. Набережная от дома 243 до дома 321 в с. Костёнки

Финансовое обеспечение паспортами проектов «Формирование памятника природы на территории лесопарковой зоны «Северный лес», «Новая индустриализация региона» и «Реконструкция Петровской набережной» в отчетном периоде не предусматривалось
