




**Сводный отчет
о ходе реализации
портфеля региональных проектов
Воронежской области в 2021 году**



Реализация результатов проектов в 2021 году

■ Достигнуты 100%
 ■ Достигнуты с отклонениями 95%-99%
 ■ Не достигнуты < 95%

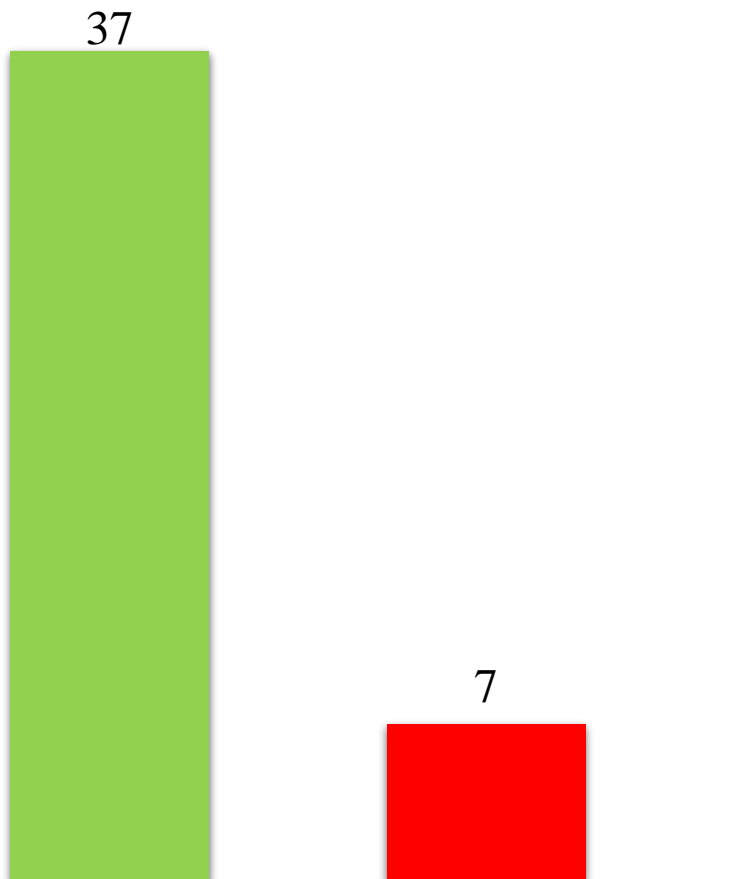


Региональный проект	Количество недостигнутых результатов	% выполнения	Причина
Чистая вода	1	50 %	Срыв сроков в части получения документов по завершённым объектам
Содействие занятости	1	50 %	Не завершено строительство 3 детских садов в с. Монастырщина Богучарский район, мкр. Репное г. Воронеж, г. Поворино
Сохранение лесов	1	75 %	Недостаточный объем финансирования мероприятий направленных на достижение результата проекта
Спорт – норма жизни	1	75 %	Не завершено строительство 2 объектов реконструкция футбольного поля МКОУ СОШ № 2 имени Н.Д. Рязанцева и реконструкция стадиона в г. Бутурлиновка
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	1	80 %	Отсутствие компаний соответствующих особенностям требований предоставления кредитов и займов
Цифровое государственное управление	1	87,5 %	Своевременно не утвержден нормативно-правовой акт
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	1	92,3 %	Снижение деловой активности в целом, в том числе, экспортной, уменьшение числа субъектов МСП в следствии пандемии новой коронавирусной инфекции и частичных экономических ограничений



Достижение показателей проектов в 2021 году

■ Достигнуты 100%
 ■ Достигнуты с отклонениями 95%-99%
 ■ Не достигнуты < 95%

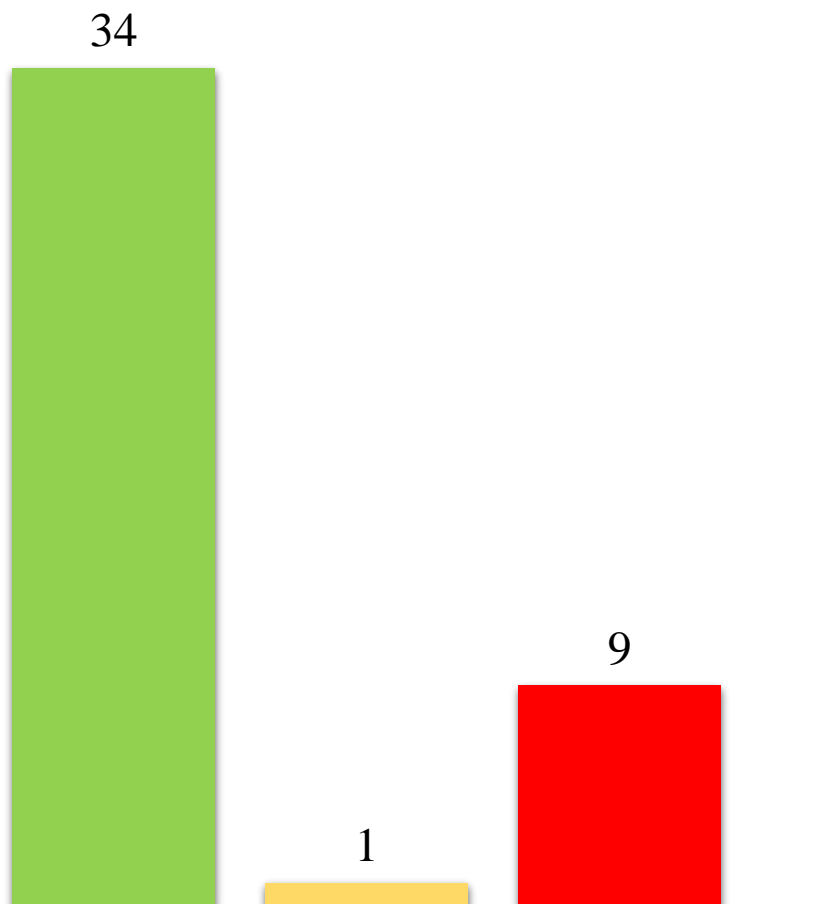


Региональный проект	Количество недостигнутых показателей	% выполнения	Причина
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	4	33,3 %	В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе временно приостанавливались консультативный прием и диагностические исследования. Пациенты обращались за медицинской помощью в тяжелом состоянии из-за страха заражения новой коронавирусной инфекцией
Борьба с онкологическими заболеваниями	1	75 %	Окончательные сведения будут сформированы до 15.02.2022 на основании сведений годового мониторинга централизованных систем водоснабжения
Чистая вода	2	33,3 %	Изменение Минсельхозом России методики расчета показателей при экспорте масложировых культур и прочей продукции АПК, а также завышенном плановом показателе для региона по экспорту рыбы
Экспорт продукции АПК	5	37,5 %	Выявление пациентов с диагнозом «ожирение» в ходе профилактических мероприятий
Укрепление общественного здоровья	1	50 %	Не завершено строительство 3 детских садов в с. Монастырщина Богучарский район, мкр. Репное г. Воронеж, г. Поворино
Содействие занятости	1	50 %	В методике расчета показателей не учитывается медицинский персонал негосударственных медицинских организаций, составляющий значительную часть
Обеспечение медицинских организаций кадрами	3	70 %	В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе временно приостанавливались консультативный прием и диагностические исследования
Старшее поколение	1	80 %	Утверждение временных штатных расписаний для лечения больных с коронавирусной инфекцией, рост младенческой смертности за счет перинатальных причин и врожденных пороков развития, роста смертности от внешних причин
Развитие детского здравоохранения	2	84,6 %	Изменение Минздравом России методики расчета показателей
Цифровой контур здравоохранения	2	95,8 %	



Кассовое исполнение проектов в 2021 году

■ Достигнуты 99%-100%
 ■ Достигнуты с отклонениями 95%-99%
 ■ Не достигнуты < 95%

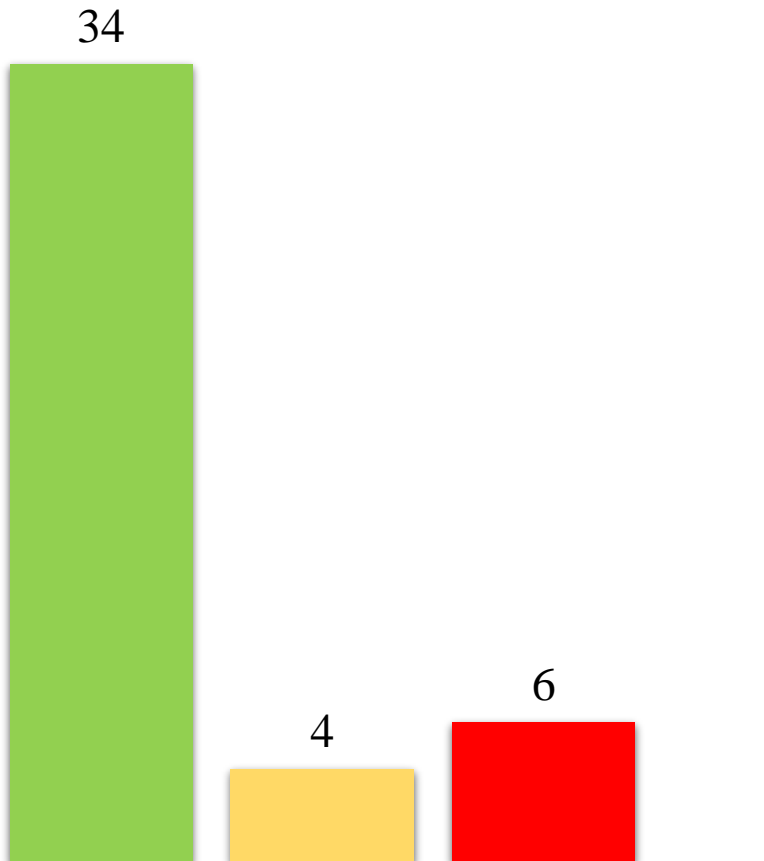


Региональный проект	% освоения	Причина
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	74,9 %	Заключены 36 из 39 МК на приобретение помещений по эскроу-счетам. По одному помещению в Березовском с/п Бутурлиновского р-на идет судебный процесс. Не завершено строительство домов для переселения (Семилуки, Поворино (2 дома), Россошь, Таловское г/п, Павловск, Стрелица)
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	79,3 %	В связи с образовавшейся экономией при осуществлении закупочных процедур по приобретению камер фото-видеофиксации
Содействие занятости	82 %	Не завершено строительство 3 объектов детский сад в с. Монастырщина Богучарский муниципальный район, детский сад в мкр. Репное г. Воронеж, детский сад в г. Поворино
Спорт – норма жизни	84,4 %	Условия соглашения о реализации регионального проекта выполнены. Неосвоены дополнительные средства областного бюджета
Жилье	87,2 %	Условия соглашения о реализации регионального проекта выполнены. Неосвоены дополнительные средства областного бюджета
Развитие детского здравоохранения	90,1 %	Условия соглашения о реализации регионального проекта выполнены. Неосвоены дополнительные средства областного бюджета
Формирование комфортной городской среды	96,3 %	Не были приняты к учету фактически выполненные объемы работ по объектам в связи с непредоставлением актов выполненных работ, в том числе актов КС-2
Творческие люди	96,9 %	Экономия образовалась по итогам проведения торгов на проведение культурно-просветительской программы для школьников
Развитие оказания первой медико-санитарной помощи	96,9 %	В связи с образовавшейся экономией при осуществлении закупочных процедур
Современная школа	98 %	Условия соглашения о реализации регионального проекта выполнены. Неосвоены дополнительные средства областного бюджета



Объекты капитального строительства в рамках реализации проектов в 2021 году

■ Сданы в срок ■ Не сданы ■ Переходящие

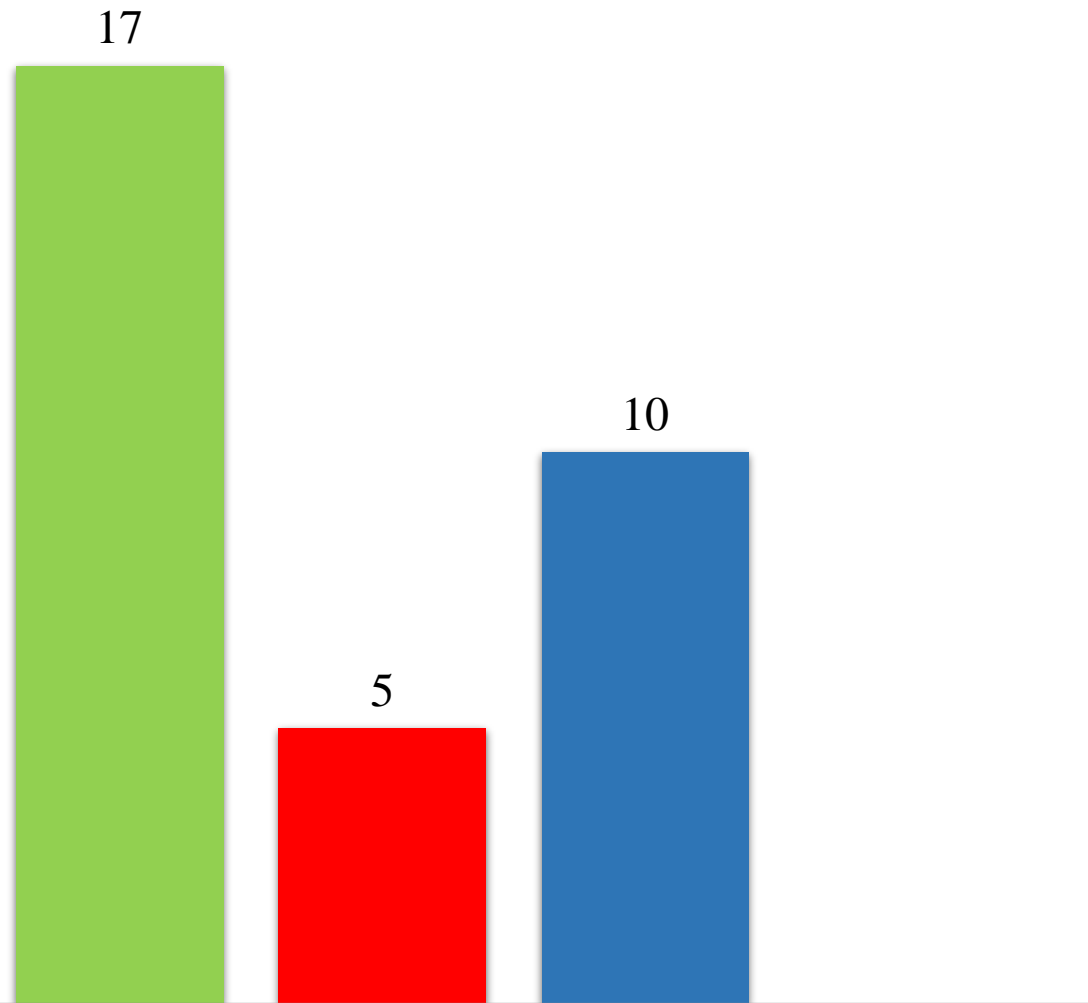

Объекты капитального строительства с вводом в эксплуатацию в 2021 году

Региональный проект	Количество объектов капитального строительства	% завершения
Содействие занятости	7	57,2 %
Жилье	3	100 %
Культурная среда	1	100 %
Чистая вода	8	100 %
